

Phân tích rủi ro quy trình mở mới cửa hàng

Chuyên đề rà soát toàn diện công tác xây dựng & mở mới mặt bằng

GIAI ĐOẠN 1: TÌM KIẾM & THẨM ĐỊNH MẶT BẰNG



**Tìm kiếm MB
(PTML)**



Thẩm định
(VH, TC, QH)



HĐTĐ Quyết định

GIAI ĐOẠN: T1/2026 - T4/2026

Tổng hồ sơ


273

Tỷ lệ không đạt

45%

(123 hồ sơ)

Chi tiết các nguyên nhân thẩm định không đạt

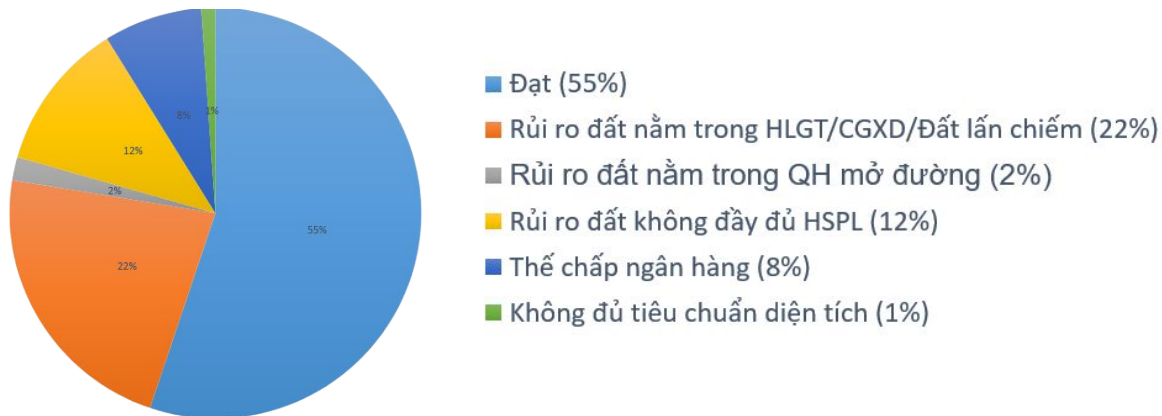

RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN TÌM KIẾM & THẨM ĐỊNH

Khâu Tìm kiếm

- Nhượng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật/điện tích do áp lực chỉ tiêu.
- Thỏa thuận ngầm nâng giá thuê.
- Giao tiếp thiếu rõ ràng về HSPL gây tranh chấp với chủ nhà.

Khâu Thẩm định

- Quá chú trọng tài chính, bỏ qua rủi ro hạ tầng (nhà cũ, kết cấu yếu).
- Định giá sai chi phí gia cố thực tế.
- Bỏ lọt rủi ro quy hoạch, HLGT.
- Chấp nhận mặt bằng thiếu HSPL (không phép XD, thiếu điện 3 pha).

Quyết định HĐTĐ

Quyết định "Đồng ý"

Dựa trên dữ liệu khảo sát sơ bộ, thiếu các cảnh báo về pháp lý xây dựng hoặc chi phí gia cố kết cấu phát sinh lớn.

CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐIỂN HÌNH



MB Đơn Thư

Vướng hành lang giao thông (HLGT), nguy cơ bị phá dỡ cao.



MB 14 Tây Tựu

Bị đình chỉ thi công do không có Giấy phép xây dựng (GPXD).



MB Đông Hạ

Đất nông nghiệp, không thể cấp được nguồn điện 3 pha.

GIẢI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ & LẬP DỰ TOÁN (BOQ)



Khảo sát hiện trạng

Thu thập dữ liệu thực tế tại mặt bằng, đánh giá các điều kiện kỹ thuật hiện hữu.



Thiết kế & Layout

Phát triển ý tưởng không gian, bố trí công năng và thẩm mỹ chi tiết.



Phát hành BOQ & Ngân sách

Lập bảng khối lượng chi tiết và xác định tổng mức đầu tư dự kiến.

GIẢI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ & LẬP DỰ TOÁN (BOQ)



Khảo sát

- Đánh giá "hộp" qua ảnh/video.
- Sai lệch kích thước thực tế.
- Bỏ lọt các lỗi hạ tầng ngầm.



Thiết kế

- "Chạy lứt" tiến độ dẫn đến sai sót.
- Bản vẽ thiếu tính toán tải trọng.
- Layout vướng cột/hộp kỹ thuật.



Dự toán (BOQ)

- Thiếu khối lượng do khảo sát hơi hợt.
- Nhà thầu cắt xén hạng mục an toàn để bù chi phí.

GIAI ĐOẠN 3: LỰA CHỌN NHÀ THẦU (MPO)



**Lập hồ sơ mời
thầu**



Đánh giá NCC



**Đấu thầu/ Chỉ
định thầu**



Ký hợp đồng

GIAI ĐOẠN 3.2: LỰA CHỌN & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG



Lựa chọn

- Tình trạng "Khoán trắng": Bán thầu cho đội thợ địa phương kém chuyên môn.
- Nhà thầu trúng nhiều điểm dẫn đến vắng bóng Chỉ huy tại hiện trường.



Ký hợp đồng

- Hợp đồng dài hạn tạo sự chủ quan trong việc duy trì chất lượng.
- Cơ chế phạt vi phạm An toàn lao động (ATLĐ) thiếu tính răn đe.

GIAI ĐOẠN 4: THI CÔNG & GIÁM SÁT (TRỌNG TÂM)



GIẢI ĐOẠN 4.2: QUẢN TRỊ RỦI RO THI CÔNG



Vi phạm Kỹ thuật & An toàn

- Tự ý thay đổi biện pháp thi công nguy hiểm (VD: dùng máy xúc thay dầm I).
- Vi phạm ATLĐ nghiêm trọng (không bảo hộ, thi công điện sống).
- Bỏ qua cảnh báo cho hộ liền kề.



Lỗi hỏng Giám sát & Vật tư

- Vắng mặt Chỉ huy trưởng & GSXD tại thời điểm nhạy cảm.
- Hiện tượng "Rút ruột" vật liệu (thép mỏng, dây điện kém chất lượng).

GIAI ĐOẠN 4.3: QUẢN TRỊ RỦI RO THI CÔNG



Thực trạng

Hiện nay, đội ngũ giám sát đang phải đối mặt với khối lượng công việc vượt chuẩn:

- 1 Giám sát quản lý từ 5-10 cửa hàng.
- Địa bàn quản lý rộng, liên tỉnh gây khó khăn trong di chuyển.



Hệ quả & Rủi ro

- Không thể đảm bảo giám sát 24/7 tại các điểm nóng.
- Nghiệm thu rủi ro qua "báo cáo hình ảnh" không trung thực từ nhà thầu.
- Tiềm ẩn sai sót kỹ thuật và gian lận vật tư.

GIAI ĐOẠN 5: NGHIỆM THU & QUYẾT TOÁN



**Nghiệm thu bàn
giao (D-1)**



**Kiểm tra hồ sơ hoàn
công**



Thanh quyết toán

GIAI ĐOẠN 5.2: NGHIỆM THU & QUYẾT TOÁN

**Nghiệm thu bàn giao**

Ký nghiệm thu "tạm" do áp lực tiến độ Opening.

- Hệ quả: Phát sinh hư hỏng ngay sau vận hành.
- Rủi ro cơ quan chức năng xử phạt.

**Thanh quyết toán**

Hồ sơ hoàn công chậm trễ, sai lệch BOQ thực tế.

- Gây tắc nghẽn công tác kiểm toán nội bộ.

The logo for WinCommerce, featuring the word "WinCommerce" in a white, sans-serif font. The "W" is stylized with a thick, bold stroke. The background is a solid red color with a large, faint, dark red heart shape in the center. In the top left and right corners, there are white circuit-like patterns consisting of lines and small circles.

WinCommerce

Trân trọng cảm ơn
